WINNEWISSERBAUMANAGEMENT

171.001 Neubau Via Stand 19.03.19 WU

	Name	Dauer	Anfang
1			
2			
3			
4	▼ **allg. Baustelleninstallation**	**14 t?**	**25.07.2018**
5	Baustrom	1 t?	27.07.2018
6	Bauwassser	0.88 t?	27.07.2018
7	Toitoi	1 t?	13.08.2018
8	Abschrankungen	2 t?	25.07.2018
9	Baumschutz	2 t?	27.07.2018
10			
11			
12	▼ **Spezial Tiefbauarbeiten**	**45 t**	**16.07.2018**
13	Grasnarbe entfernen	5 t	16.07.2018
14	Voraushub Nagelwand	5 t	23.07.2018
15	Nagelwände	15 t	30.07.2018
16	Pfählarbeiten	25 t	13.08.2018
17	Aushubarbeiten	29 t	30.07.2018
18			
19			
20	▼ **Rohbauarbeiten 1**	**155 t**	**17.09.2018**
21	211 Kanalisations- und Werkleitung	30 t	17.09.2018
22	153 EWB Graben erstellen über Strasse zu Trafostation	1 t	31.01.2019
23	153 EWB Elektroeitungen Starkstrom für Hausanschluss	4 t	04.02.2019
24	211 BM Bodenplatte UG	25 t	24.09.2018
25	211 BM Wände UG	40 t	01.10.2018
26	211 BM Decke UG	40 t	15.10.2018
27	201 Start Hinterfüllarbeiten	15 t	22.10.2018
28	211 BM Bodenplatte EG	10 t	12.11.2018
29	211 BM Wände EG	25 t	26.11.2018
30	211.1 Montage Gerüst	10 t	03.12.2018
31	211.1 Konsole Attika	1 t	15.03.2019
32	211 BM Decke EG	18 t	10.12.2018
33	211 BM Wände 1.OG	18 t	18.12.2018
34	211 BM Decke 1.OG	30 t	14.01.2019
35	211 BM Wände AT	7 t	27.02.2019
36	211 BM Fertigstellungsarbeiten	12 t	07.02.2019
37	214 Rohbaumontage Holzbau und Dach	30 t	11.03.2019
38	224.1 DB Attikaterrasse	10 t	25.02.2019
39	224.1 Winkelanschluss AT	5 t	18.03.2019
40	221 Montage Fenster	10 t	01.04.2019
41	23 Einlegen Elektro	100 t	17.09.2018
42	25 Einlegen Sanitär	100 t	17.09.2018
43			
44	▼ **Rohbauarbeiten 2**	**145 t?**	**18.03.2019**
45	214 Fassadenverkleidung	65 t	15.04.2019
46	224.1 Flachdacharbeiten	25 t	18.03.2019
47	224.1 Attikaterrasse	15 t	15.04.2019
48	222 Spenglerarbeiten	20 t	15.04.2019
49	223 Blitzschutzarbeiten	10 t	13.05.2019
50	225 Brandschutzschottungen	5 t	22.04.2019
51	226.1 Äussere Malerarbeiten	10 t	08.07.2019
52	23 Rohbau Elektro	25 t	25.03.2019
53	237 PV Anlage	15 t?	27.05.2019
54	24 Rohbau Heizung	25 t	25.03.2019
55	244 Rohbau Lüftung	25 t	25.03.2019
56	25 Rohbau Sanitär	25 t	25.03.2019
57	25 GIS Beplanken	5 t	29.04.2019
58	271 Gipser Leichtbauwände + Beplanken	15 t	18.03.2019
59	271 Beplanken Vorsatzschalen etc.	10 t	29.04.2019
60	▼ **Unterlagsboden**	**55 t**	**06.05.2019**
61	281.0 WD + TS verlegen	15 t	06.05.2019
62	24 Bodenheizungsrohre	15 t	13.05.2019
63	281.0 Estrich giessen	5 t	03.06.2019
64	240 Heizprotokoll	30 t	10.06.2019
65	225 Speziell. Dichtungen und Dämmungen	10 t	23.09.2019
66	228 Sonnenschutz	20 t?	17.06.2019
67	272 Äussere Metallbauarbeiten	20 t?	27.05.2019
68			
69			
70	▼ **Innenausbau 1**	**85 t?**	**10.06.2019**
71	261 Aufzüge	15 t	05.08.2019
72	273.0 Innentüren aus Holz	20 t	29.07.2019
73	273.0 Innentüren, Stahlzargen…	15 t?	10.06.2019
74	272 Allgemeine Metallbauarbeit…	20 t?	08.07.2019
75	258 Kücheneinrichtungen	20 t	29.07.2019
76	271.0 Gipserarbeiten Abrieb	20 t	10.06.2019
77	271.0 Gipserarbeiten Deckputz	5 t	10.06.2019
78	273.1 Allgemeine Schreinerarbeiten	30 t?	29.07.2019
79	275 Schliessanlage	15 t	16.09.2019
80	23 Ausbau Elektro	70 t?	10.06.2019
81	24 Ausbau Heizung	35 t	29.07.2019
82	244 Ausbau Lüftung	15 t	26.08.2019
83	250 Sanitäranlagen	30 t	05.08.2019
84			
85			
86	▼ **Innenausbau 2**	**85 t?**	**15.07.2019**
87			
88	281.6 Fugenloser Spachtelbelag	30 t	15.07.2019
89	281.7 Bodenbelagsarbeiten Parkett	30 t?	22.07.2019
90	282.4 Fugenloser Spachtelbelag	30 t	15.07.2019
91	285.1 Innere Malerarbeiten	30 t	15.07.2019
92	285.1 Malerarbeiten EL Keller	15 t	26.08.2019
93	Allgemeine Fertigstellungsarbei…	15 t	07.10.2019
94	287 Baureinigung	15 t	21.10.2019
95			
96	▼ **Abnahmen**	**26 t?**	**11.11.2019**
97	Vorabnahmen Bauleitung / Arc…	5 t?	11.11.2019
98	Mängelbehebung 1	10 t?	18.11.2019
99	SIA Abnahmen	5 t?	02.12.2019
100	Mängelbehebung 2	5 t?	09.12.2019
101	Übergabe an die Bauherrschaft	1 t?	16.12.2019

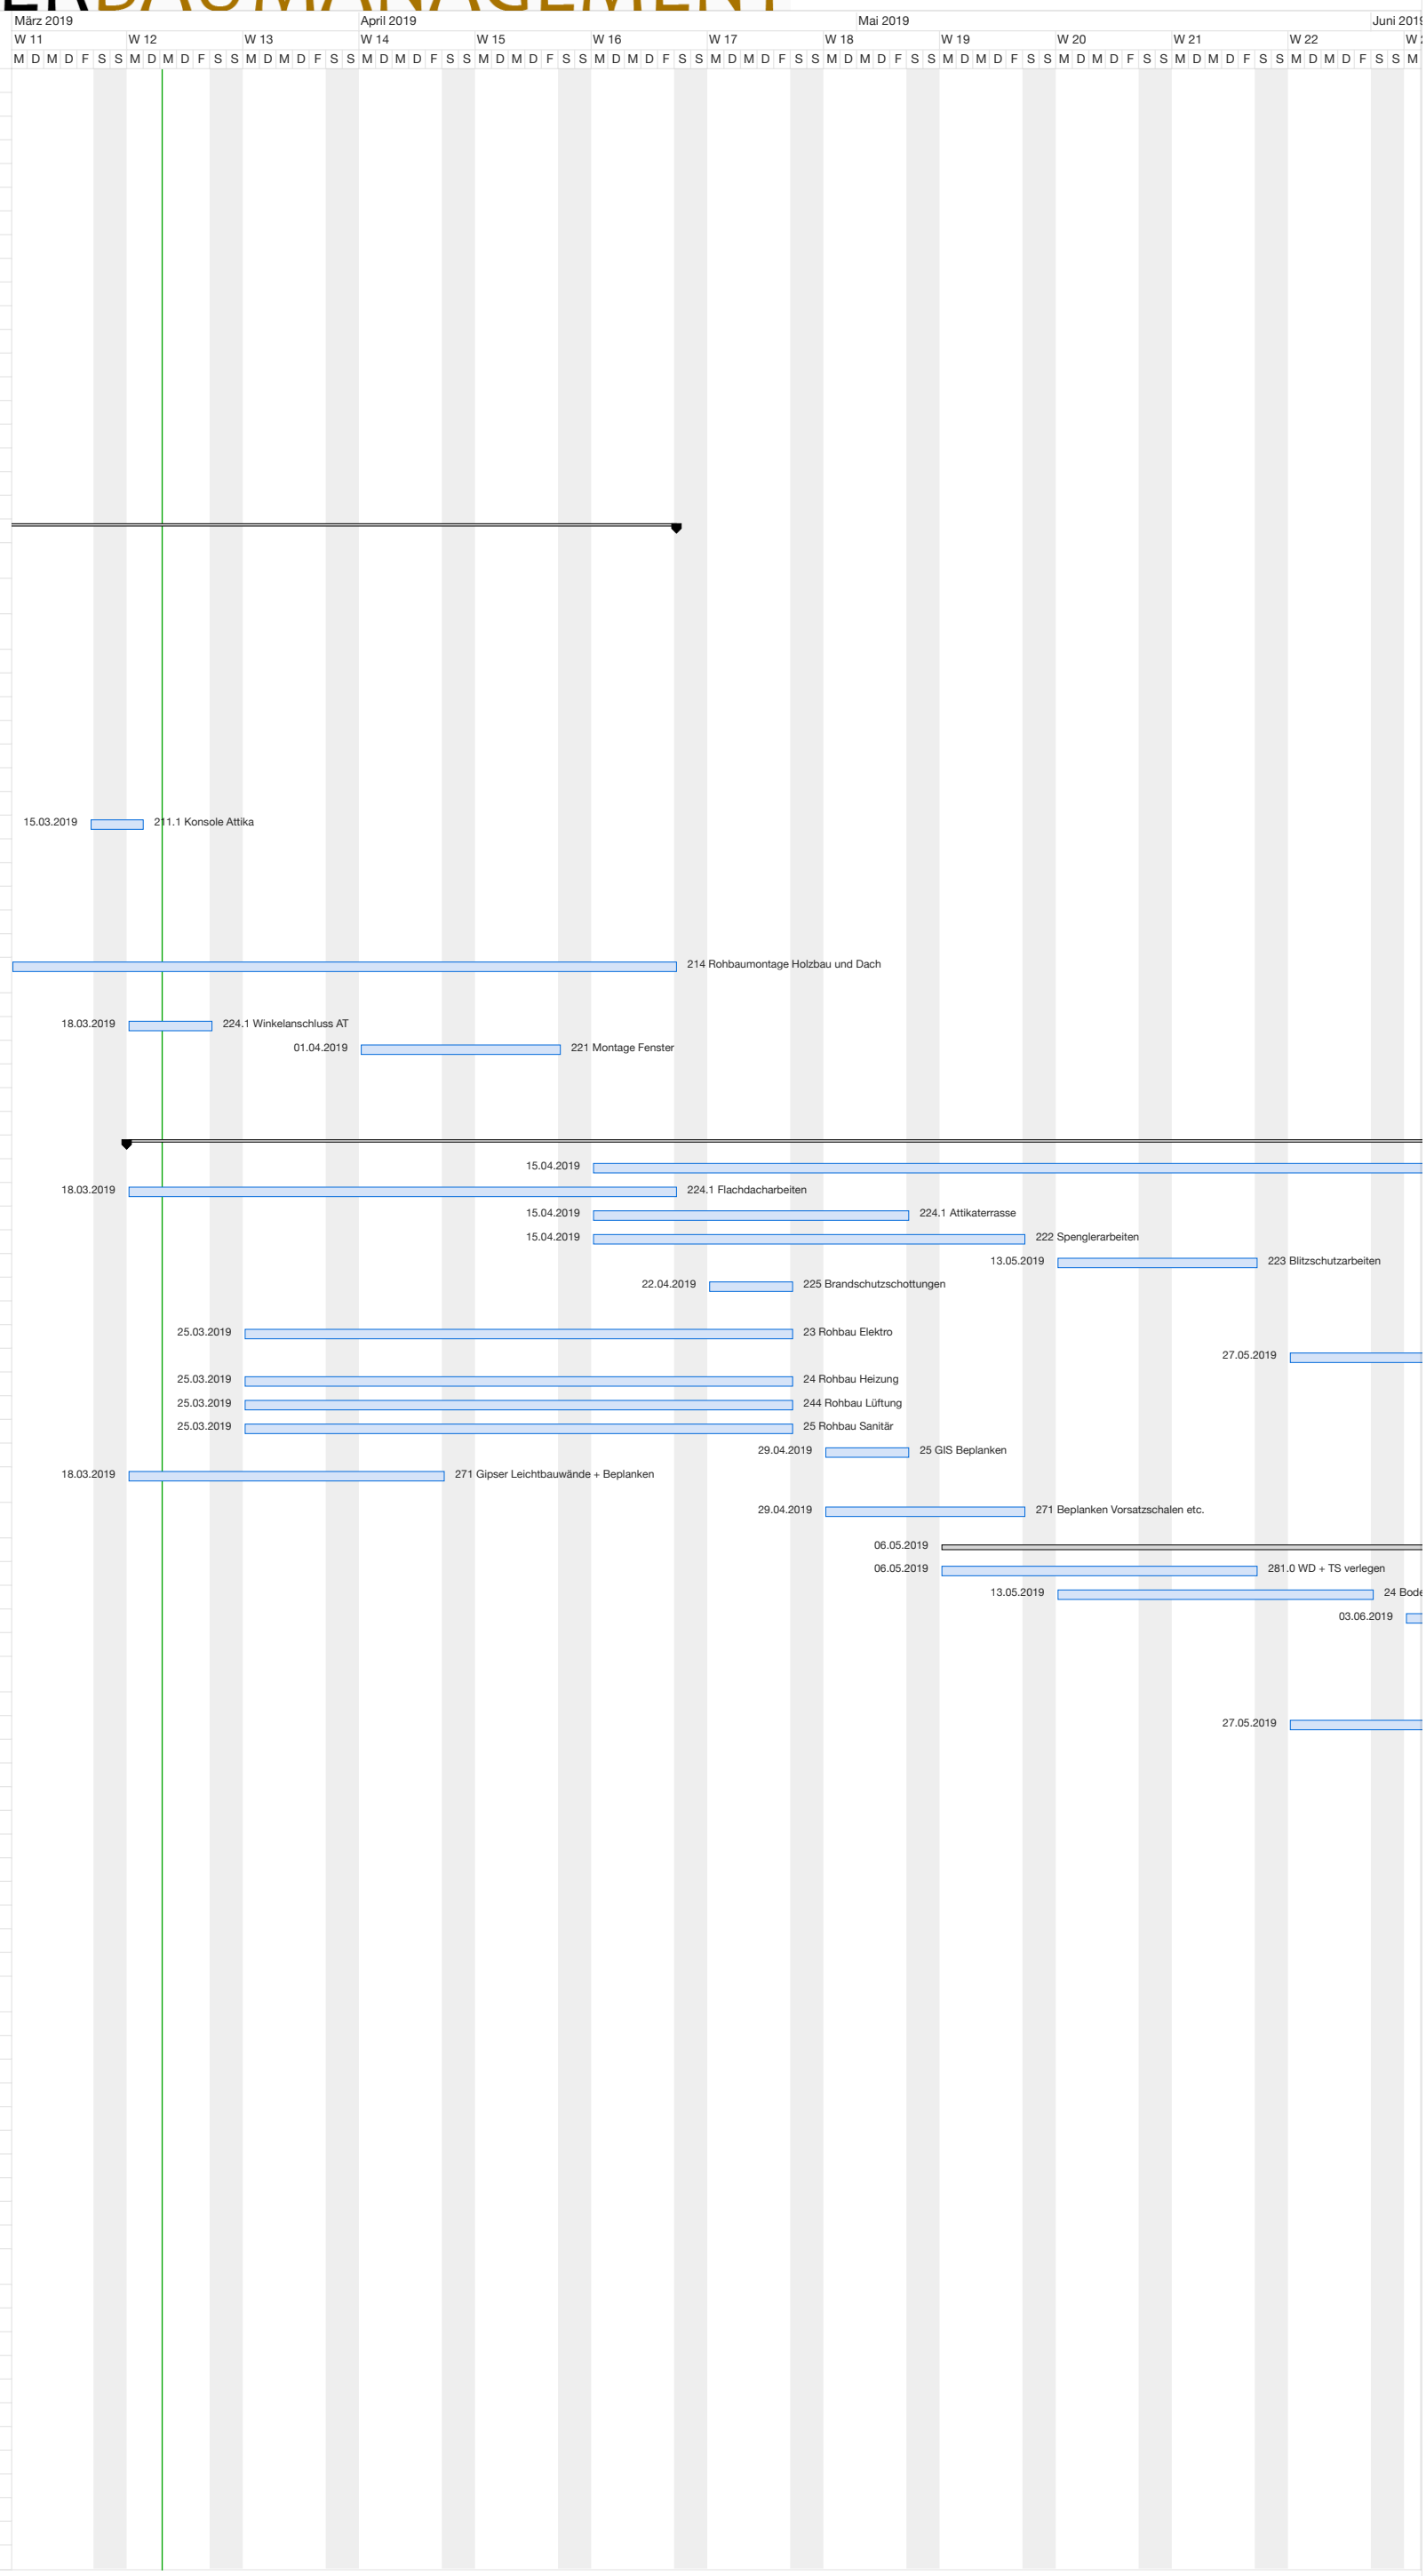

Winnewisser Baumanagement GmbH
Zentweg 21d I 3006 Bern I T 031 566 76 00 I F 031 566 76 01 I E-Mai

WINNEWISSERBAUMANAGEMENT

171.001 Neubau Via

Stand 19.03.19 WU

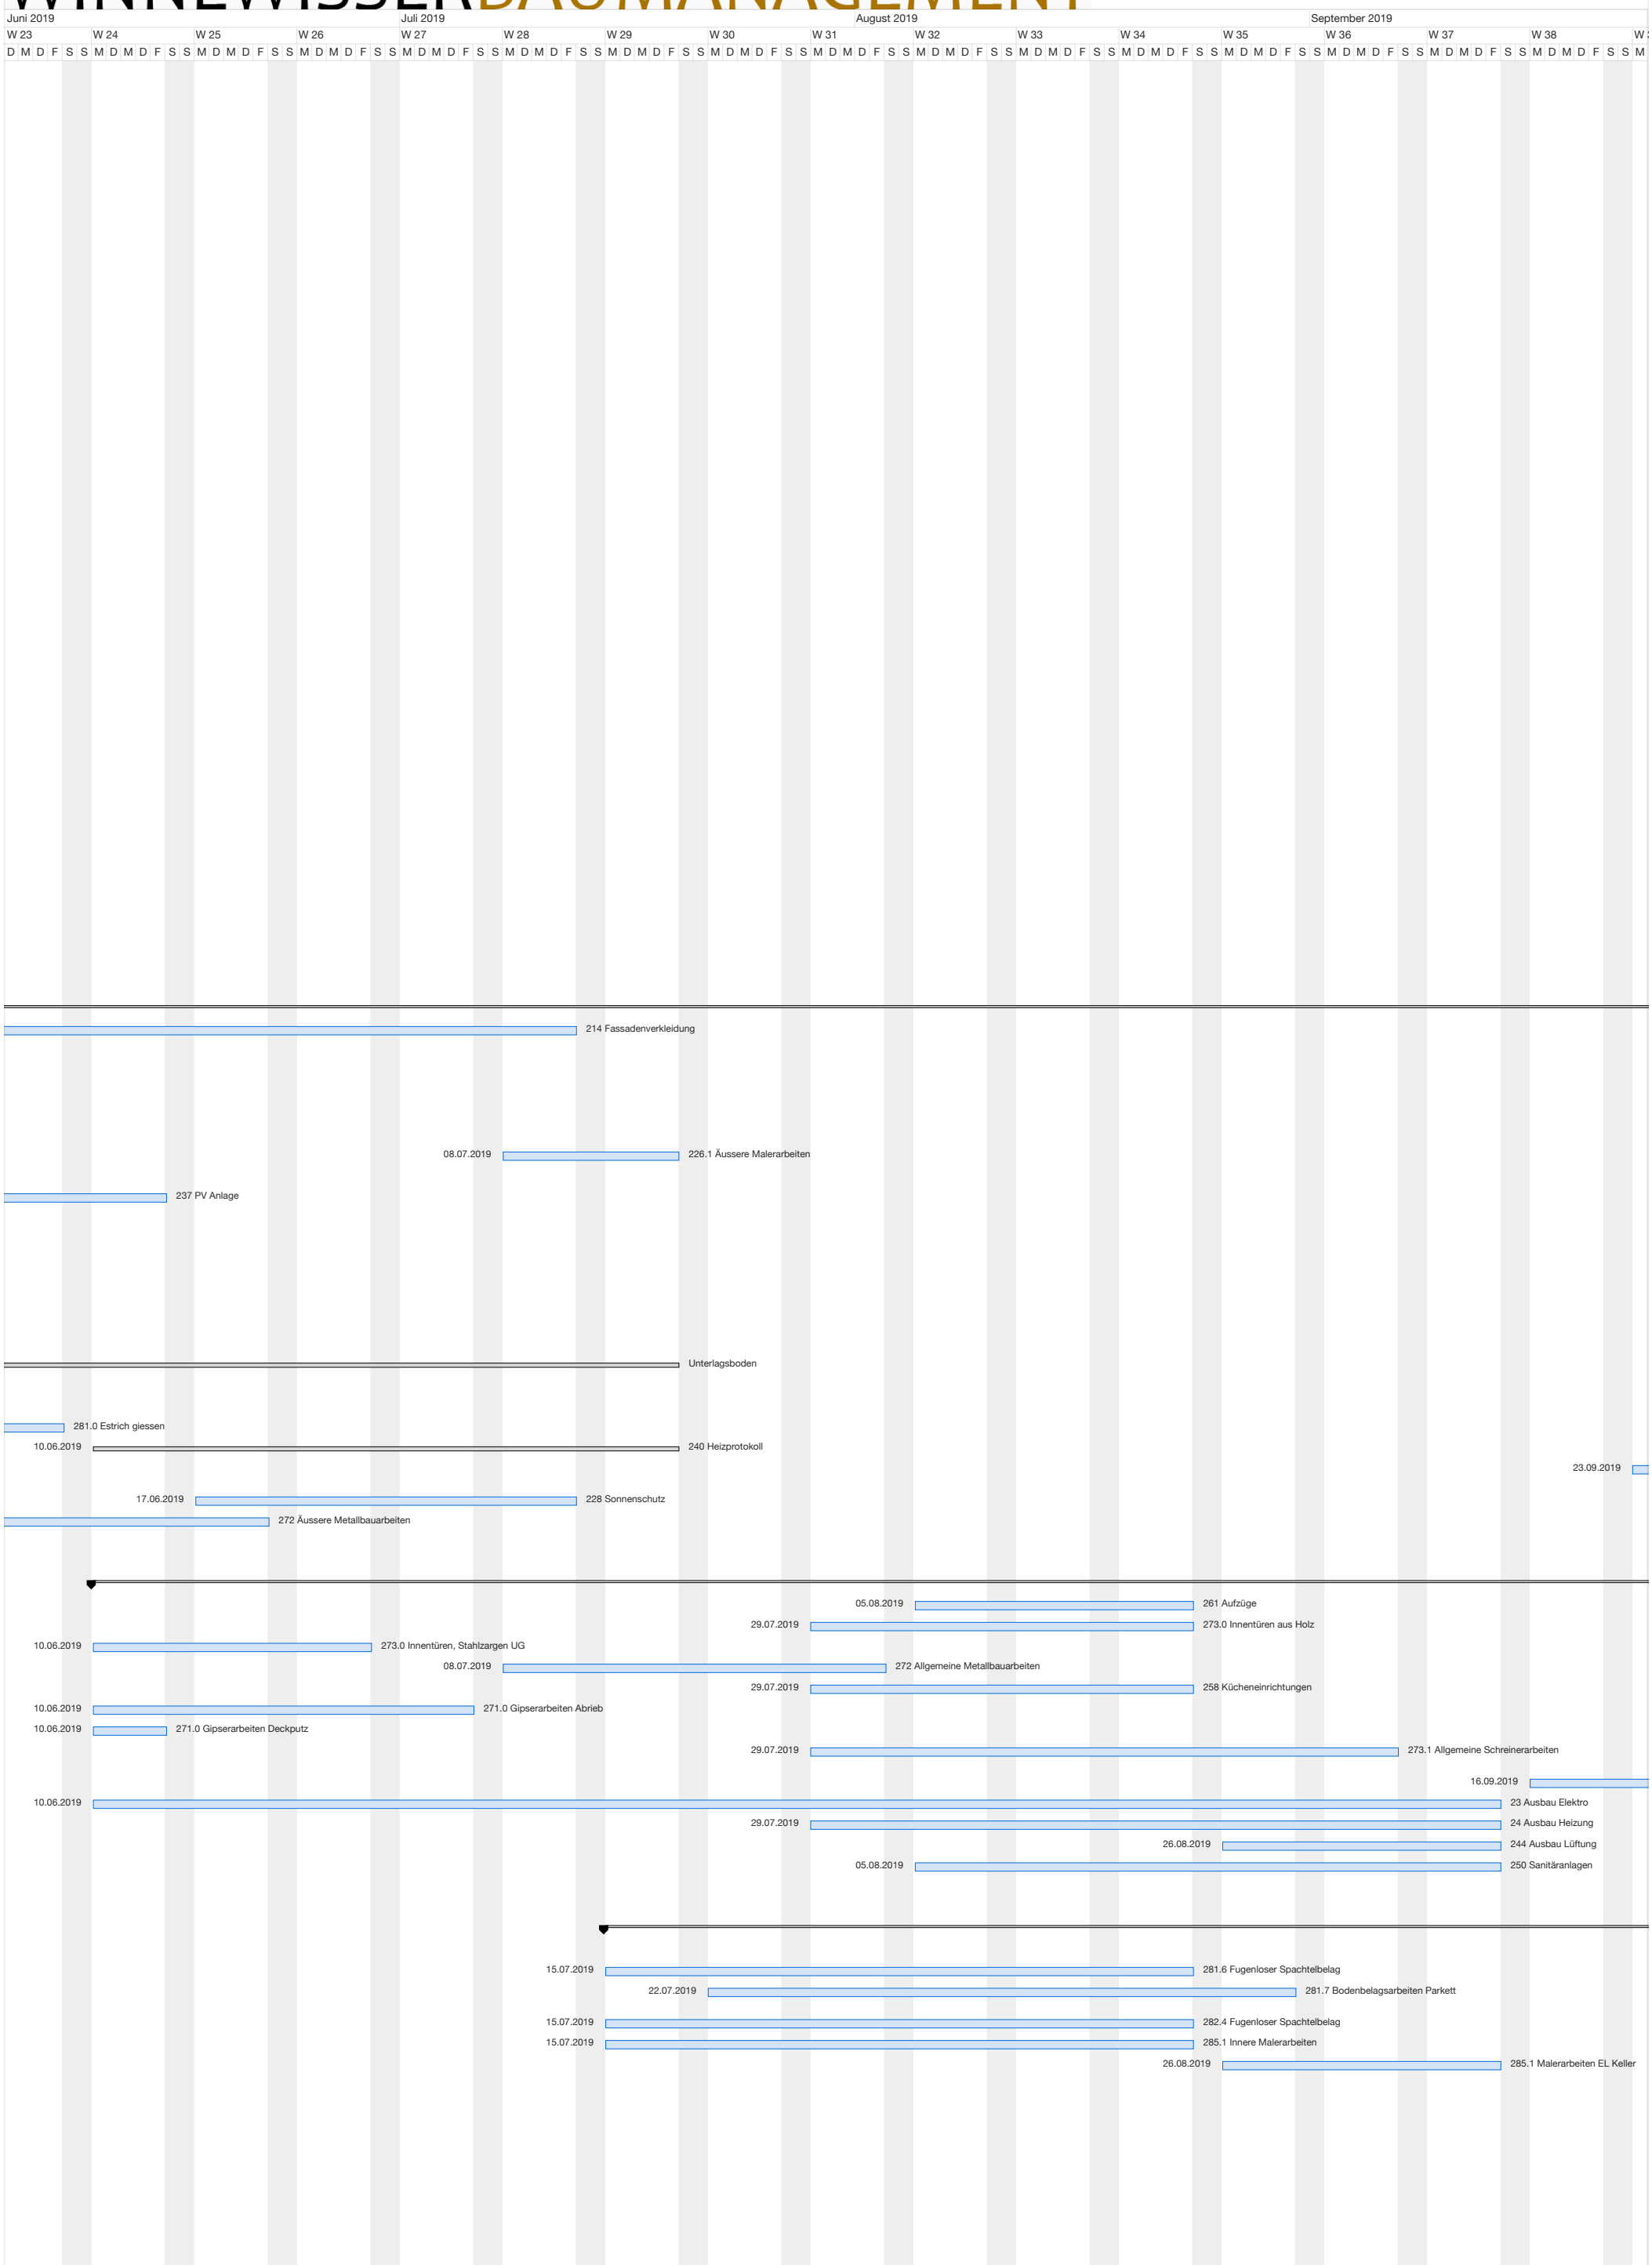

Winnewisser Baumanagement GmbH
Zentweg 21d I 3006 Bern I T 031 566 76 00 I F 031 566 76 01 I E-Mai

WINNEWISSERBAUMANAGEMENT

171.001 Neubau Via

Stand 19.03.19 WU

September 2019 | Oktober 2019 | November 2019 | Dezember 2019

W 39 W 40 W 41 W 42 W 43 W 44 W 45 W 46 W 47 W 48 W 49 W 50 W 51

D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D

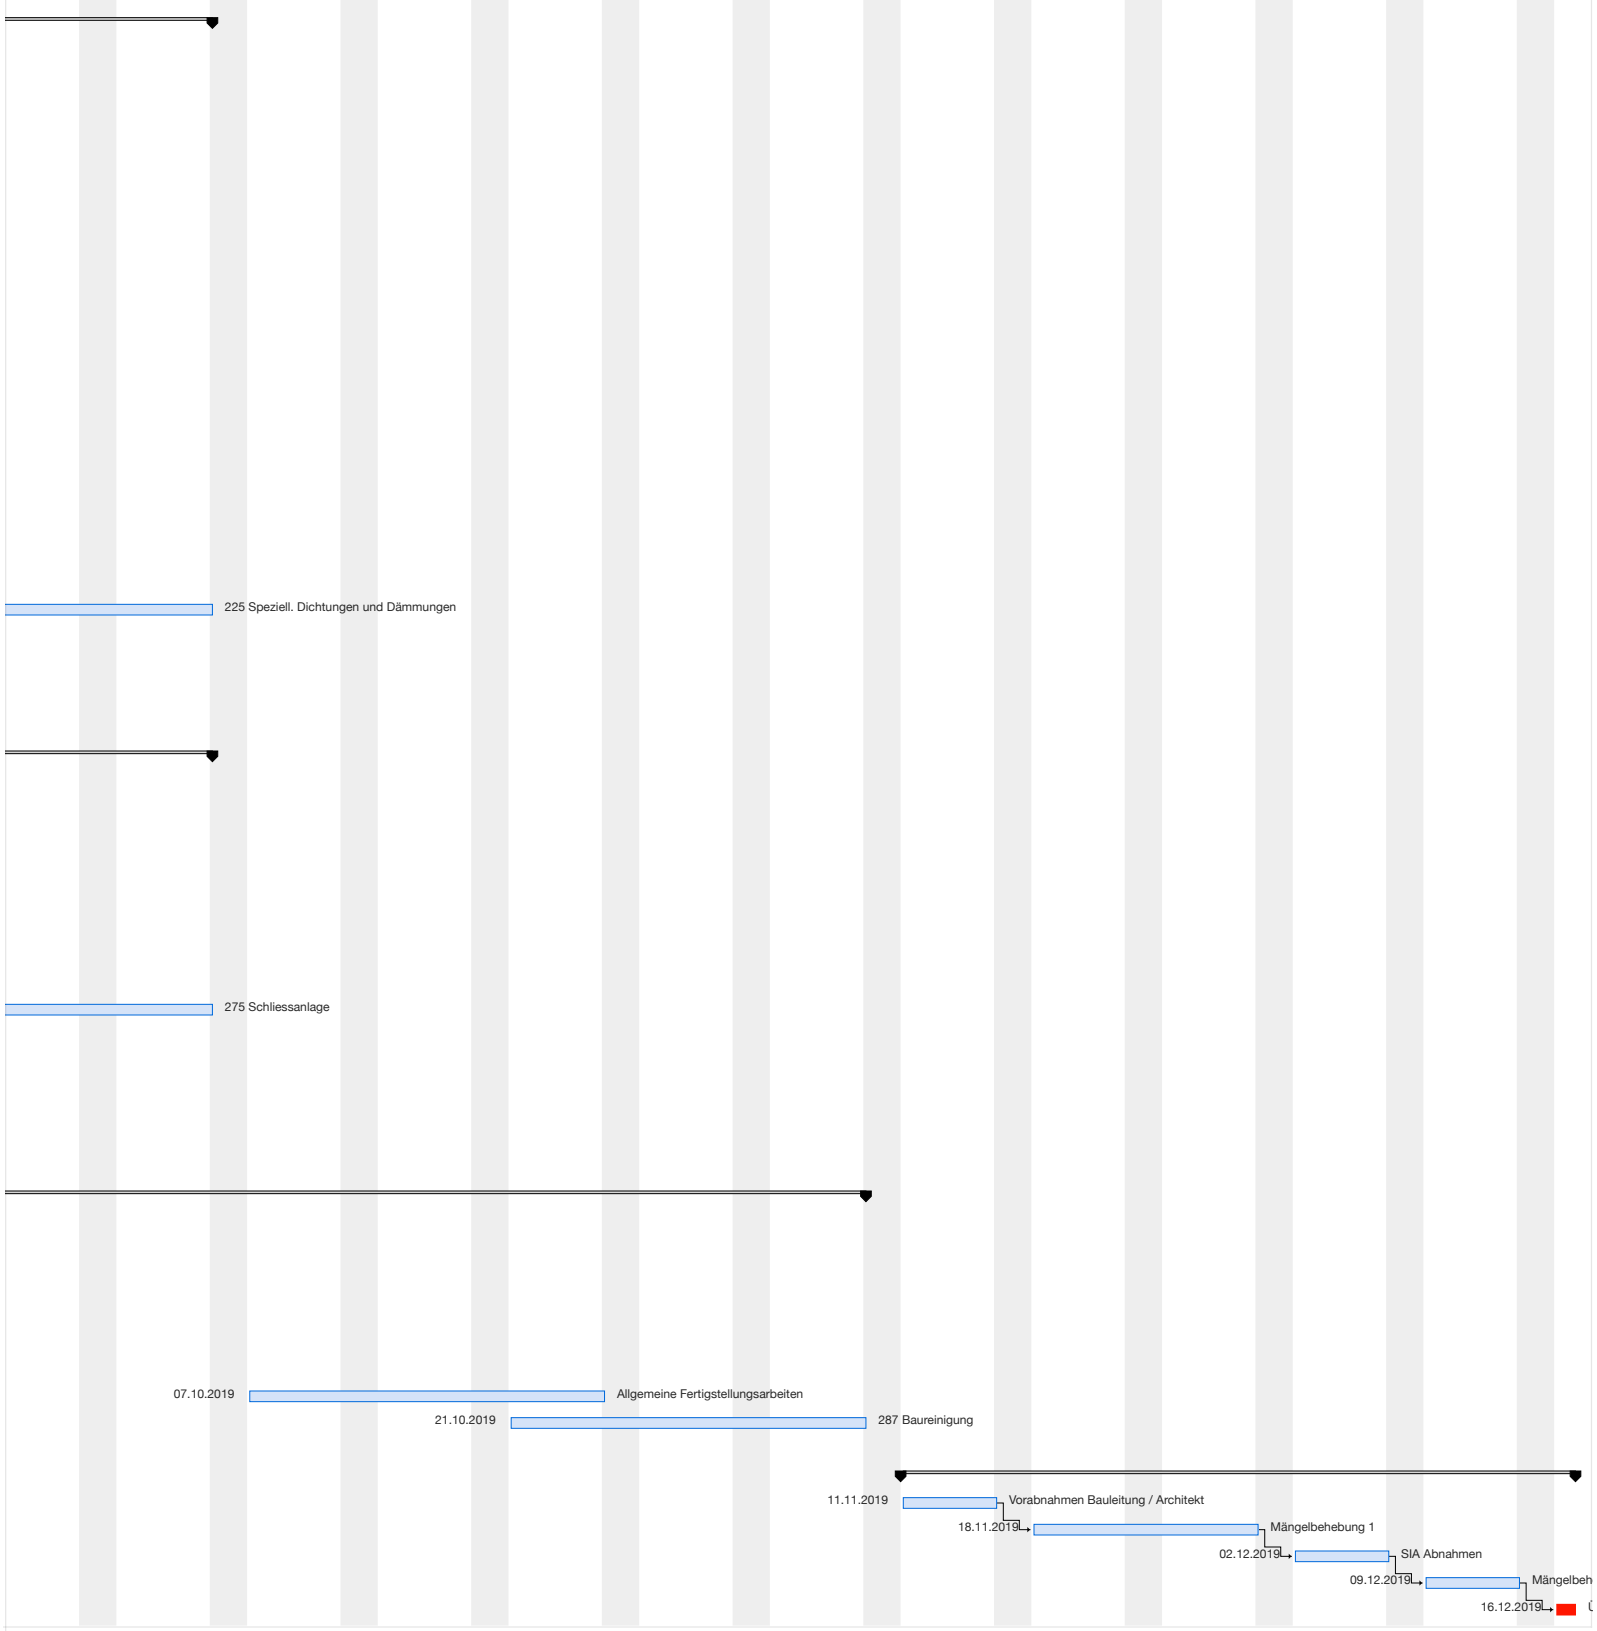

Winnewisser Baumanagement GmbH
Zentweg 21d I 3006 Bern I T 031 566 76 00 I F 031 566 76 01 I E-Mai
